



ประกาศเทศบาลนครลำปาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง




**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)**

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ดังนี้

๑. การดำเนินงานในภาพรวม (แยกตามยุทธศาสตร์)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

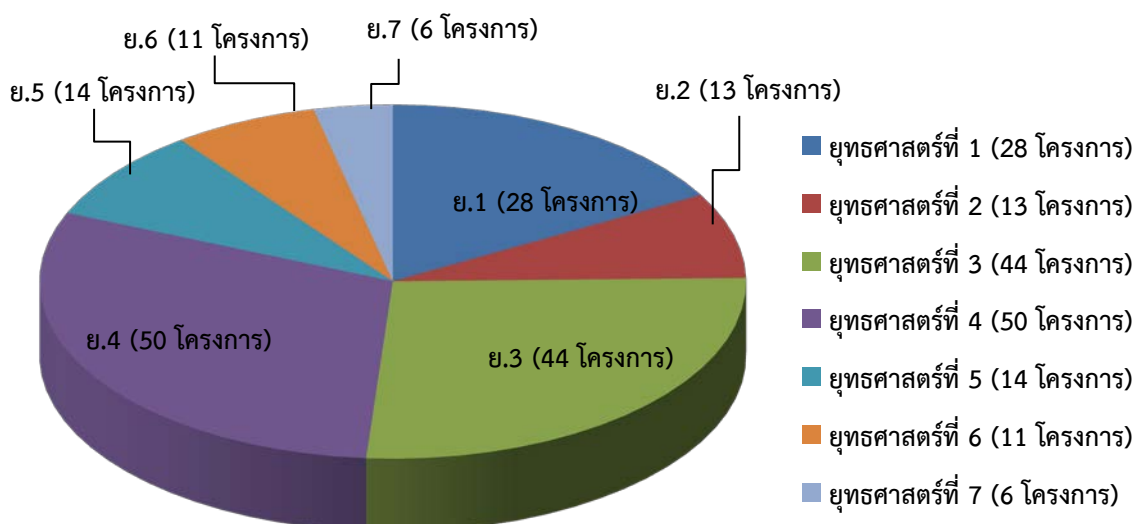

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน ๒๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวน ๑๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวน ๔๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน ๕๐ โครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีจำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวน ๖ โครงการ

๒. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๕ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๘ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒๖๒,๓๖๑,๕๔๗ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๑๙๖,๗๒๒,๑๐๒.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

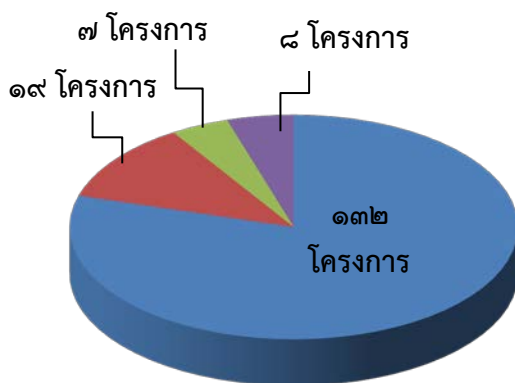

- ดำเนินการแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ยกเลิก

โครงการทั้งหมด	๑๖๖ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๒ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๕)
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒)
ยกเลิก	๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๒)
งบประมาณที่ได้รับ	๒๖๒,๓๖๑,๕๔๗ บาท
งบประมาณที่ใช้ไป	๑๙๖,๗๒๒,๑๐๒.๔๕ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๘)

๓. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๐๖,๗๔๑,๙๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๙๕,๕๘๙,๑๙๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๕



โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				
๑	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	ไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	ยกเลิกโครงการ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	ไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	ยกเลิกโครงการ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจาก กรมส่งเสริมฯ ให้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ แต่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ	กองสวัสดิการสังคม


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒,๐๓๒,๕๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๑,๘๑๐,๗๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙



โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน				
๑	รับฟังความคิดเห็นเทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	เทศบาลฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติตามคำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่างเทศบัญญัติ จึงยังไม่สามารถดำเนินการรับฟังความคิดเห็นได้	ยกเลิกโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีเงินคงเหลือมากกว่า ๒ เท่าของประมาณการรายรับ สปสช. จึงมีหนังสือแจ้งงดการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ จากกองทุน สปสช. ดังนั้น เทศบาลฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้	ยกเลิกโครงการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๑ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๔๑ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๗๗,๒๑๕,๐๙๗ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๗๑,๔๒๘,๘๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๑

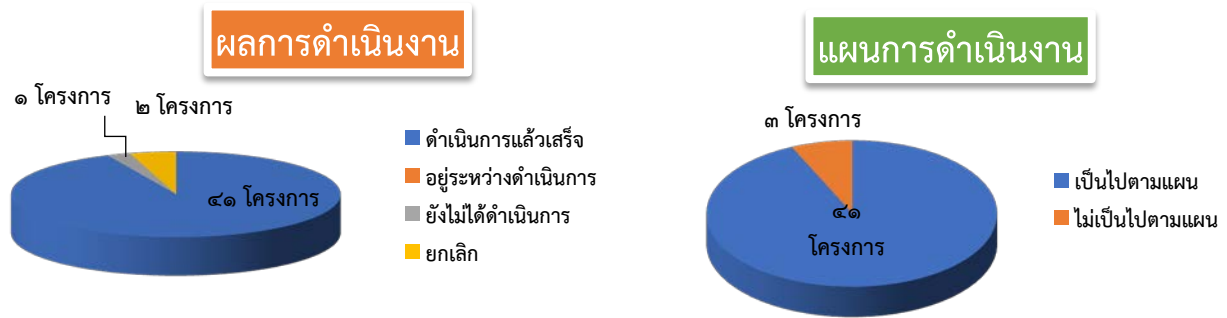

โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ และ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน				
๑	ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ	ยกเลิกโครงการ	สำนักงานการศึกษา
๒	ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ	ยกเลิกโครงการ	สำนักงานการศึกษา
๓	ก่อสร้างประตูด้านข้างโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมุล)	ชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จก่อน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามังเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓๗ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๔,๒๔๔,๓๕๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๑๖,๗๒๐,๗๑๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖



โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓๗ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑	ก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด	จะดำเนินการหลังจากบ่อฝังกลบมีปริมาณขยะเต็มบ่อฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	ยกเลิกโครงการ	สำนักงานช่าง
๒	อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย	เนื่องจากก่อนการอบรมจะต้องดำเนินการออกสำรวจพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายตามแนวท่อ ซึ่งเมื่อออกสำรวจพื้นที่จริงแล้ว พบว่าข้อมูลการสำรวจไม่ครบถ้วน ตรงตามใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ต้องมีการประสานข้อมูลเพิ่มเติม จึงทำให้การอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๓	ก่อสร้างถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๕/๑๐ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๕/๙	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๔	ก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๙๕ ถึงถนนบ้านดง ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๑	อยู่ระหว่างสอบแนวเขตที่ดิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๕	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย ๕ ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ ๒๓๑/๒	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๓๓๗,๔๘๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๖	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐	อยู่ระหว่างสอบแนวเขตที่ดิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๗	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตง มินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๔ ถึงถนนรอบเวียงข้างบ้านเลขที่ ๕๗	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๘	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๔ ซอย ๙ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๕๑/๑ ถึงข้างบ้านเลขที่ ๒๗	เนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๕๙,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๙	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีปงชัย ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๗๔	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๘๙,๕๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพักถนนบ้านดงไชย ซอย ๕ ตั้งแต่ถนนวังขวา ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๓/๖ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕/๓	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพักถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๙ ถึงถนนวังเหนือบ้านเลขที่ ๑๐	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๑๓	ก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอยในเขตเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑๔	ก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒๔๗,๕๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนข้างแตรม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าตันเกียถึงถนนประตูม้า	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนซอยกู่เก้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชยข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๑,๘๓๗,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๑๐๑๙	อยู่ระหว่างสอบแนวเขตที่ดิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจริญสุข (ข้างบริษัท โค้วอยู่ฮะ)	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘๑๑,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๒๐	ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนปงสนุกข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕/๑ ถึงถนนจามเทวี ซอย ๓	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๒๑	ปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุกข้างบ้านเลขที่ ๒๒๐/๑ ถึงถนนจามเทวีข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๒	ปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึงถนนประตูม้า ซอย ๑	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๓	ปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ ถึงถนนพระแก้ว	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๔	ปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๕	ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย ๖ (ซอยข้าวปั้น) ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๒๙ ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน	เนื่องจากก่อสร้างล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๒๘,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๒๖	ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย ๖ ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๔	เนื่องจากส่งงานล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๒๗	ปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ถึงถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๘	ปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ ๒๑	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๙๑๕,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๒๙	ปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๐	ปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๓๙๓,๔๒๗ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๑	ปรับปรุงอาคารศาลาภิรมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๙๒๙,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๒	ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๓	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำสวนสาธารณะห้วยแยกหอนาฬิกา	อยู่ระหว่างการประมาณราคา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องสืบราคาจากผู้เชี่ยวชาญ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๔	ปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ประตูเวียง)	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒๕๙,๘๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๕	ปรับปรุงรั้วและฐานประดับตกแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เนื่องจากส่งแบบล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานช่าง
๓๖	ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ทำสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงานช่าง
๓๗	รณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน	เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงพิจารณาโครงการที่เร่งก่อน ทำให้โครงการนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๑๑ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน
โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่



ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
๑	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดทำ แบบแปลน จึงทำให้ล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด เทศบาล
๒	ก่อสร้างทางลาดคนพิการ บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดทำ แบบแปลน จึงทำให้ล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด เทศบาล
๓	ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	เนื่องจากช่างไม่มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบเสาวิทยุสื่อสารมาก่อน จึงทำให้ดำเนินการจัดทำแบบแปลน ล่าช้า (เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๘๐,๙๐๐.๓๓ บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖,๗๘๓,๐๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๖,๖๖๔,๑๒๒.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ เป็นไปตามแผน จำนวน ๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓,๘๑๐,๘๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๓,๖๙๗,๒๓๘.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๒



โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ				
๑	จัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร	เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่จัดงานซ้ำซ้อนกับกิจกรรมอื่น เช่น งานรถไฟธรมมาลำปาง งานข้าวหลวงรัชฎา ๑๐๒ ปี และตรงกับช่วงเลือกตั้ง สส. จึงได้เลื่อนกำหนดการออกไป ประกอบกับเทศบาลฯ มองว่าในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. ไม่ใช่ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว จึงได้นำการจัดงานดังกล่าวมาดำเนินการในช่วงนี้แทน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดเทศบาล

๔. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (แยกตามสำนัก/กอง)

เทศบาลนครลำปาง มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ โครงการ แยกตามสำนัก/กอง ดังนี้

๔.๑ แยกตามการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ			
		ได้รับ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๒๐	๘,๑๘๐,๘๐๐	๔,๓๕๕,๘๘๓.๘๐	๕๓.๒๕	๓,๘๒๔,๙๑๖.๒๐
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๓	๑๙๘,๙๐๐	๕๗,๔๒๔.๐๐	๒๘.๘๗	๑๔๑,๔๗๖.๐๐
๓. กองคลัง	๑	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๒๘.๐๐	๘๖.๔๓	๔,๐๗๒.๐๐
๔. สำนักการช่าง	๔๙	๖๔,๑๘๔,๓๕๐	๑๖,๖๔๗,๔๔๔.๒๗	๒๕.๙๔	๔๗,๕๓๖,๙๐๕.๗๓
๕. สำนักการศึกษา	๕๓	๘๓,๖๕๓,๐๙๗	๗๗,๗๘๓,๐๔๓.๘๘	๙๒.๙๘	๕,๘๗๐,๐๕๓.๑๒
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๒,๔๕๒,๕๐๐	๒,๒๐๙,๗๕๒.๐๐	๙๐.๑๐	๒๔๒,๗๔๘.๐๐
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒๔	๑๐๓,๖๖๑,๙๐๐	๙๕,๖๔๒,๖๒๖.๕๐	๙๒.๒๖	๘,๐๑๙,๒๗๓.๕๐
รวม	๑๖๖	๒๖๒,๓๖๑,๕๔๗	๑๙๖,๗๒๒,๑๐๒.๔๕	๗๔.๙๘	๖๕,๖๓๙,๔๔๔.๕๕

๔.๒ แยกตามผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๒๐	๑๘	๙๐.๐๐	-	-	๒
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๓	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๓. กองคลัง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-
๔. สำนักการช่าง	๔๙	๒๓	๔๖.๙๔	๑๙	๖	๑
๕. สำนักการศึกษา	๕๓	๕๐	๙๔.๓๔	-	๑	๒
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑๔	๘๗.๕๐	-	-	๒
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒๔	๒๓	๙๕.๘๓	-	-	๑
รวม	๑๖๖	๑๓๒	๗๙.๕๒	๑๙	๗	๘

จากผลการดำเนินงาน พบว่า

๑. สำนักปลัดเทศบาล มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ และยกเลิก ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง และโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เนื่องจาก ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง

๒. กองวิชาการและแผนงาน มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ

๓. กองคลัง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๔. สำนักการช่าง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ พบว่า เกิดการจากส่งแบบล่าช้า บางโครงการ อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบ มูลฝอยชั้นบนสุด เนื่องจากจะดำเนินการหลังจากบ่อฝังกลบมีปริมาณขยะเต็มบ่อฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

๕. สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประตูด้านข้างโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) ได้มีการชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จก่อน ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เนื่องจาก ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการรับฟังความคิดเห็นเทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจาก เทศบาลฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเทศบาลฯ ตามคำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และปัจจุบันอยู่ระหว่างยกย่องเทศบาลฯ จึงยังไม่สามารถดำเนินการรับฟังความคิดเห็นได้ และโครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพมีเงินคงเหลือมากกว่า ๒ เท่าของประชากรรายรับ สปสช. จึงมีหนังสือแจ้งงดการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ จากกองทุน สปสช. ดังนั้น เทศบาลฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้

๗. กองสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ แต่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔.๓ แยกตามแผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	แผนการดำเนินงาน	
		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นตามแผน
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๒๐	๑๔	๖
๒. กองวิชาการและแผนงาน	๓	๓	-
๓. กองคลัง	๑	๑	-
๔. สำนักการช่าง	๔๙	๑๓	๓๖
๕. สำนักการศึกษา	๕๓	๕๐	๓
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑๓	๓
๗. กองสวัสดิการสังคม	๒๔	๒๓	๑
รวม	๑๖๖	๑๑๗	๔๙

จากแผนการดำเนินงาน พบว่า

๑. สำนักปลัดเทศบาล มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๐ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๔ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๖ โครงการ

๒. กองวิชาการและแผนงาน มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ

๓. กองคลัง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ

๔. สำนักการช่าง มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๔๙ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓๖ โครงการ


๕. สำนักการศึกษา มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๕๓ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๕๐ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ

๗. กองสวัสดิการสังคม มีจำนวนโครงการที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๔ โครงการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๓ โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ

๕. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน (งบ สปสช.)

ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบ สปสช.) จำนวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามแผน จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๖๕๖,๕๕๓ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๖๑๔,๕๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐




โดยโครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ (งบ สปสช.) ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) และ อสม. เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว	เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังฯ ซึ่งเมื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบฯ ล่าช้า จึงทำให้โครงการนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยล่าช้าไปด้วย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖. สรุปผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์)

โดยผลสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ รายการ ประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ยกเลิก จำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖ เป็นไปตามแผน จำนวน ๔๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๕๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๖ โดยมีงบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑๙,๕๓๓,๘๐๐ บาท และงบประมาณที่ใช้ไป จำนวน ๕,๕๑๒,๖๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๒



โดยครุภัณฑ์ที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ระบบทะเบียนทรัพย์สิน	เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ กำหนดให้ อบท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ e-LAAS ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานจึงยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว	กองคลัง
๒	รถลากจูงพร้อมบุษบก	เพื่อนำงบประมาณไปจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เนื่องจากในเขตเทศบาลยังมีถนนหลายสายทางที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ขาดการปรับปรุงสภาพผิวจราจร ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเดินทางไม่สะดวก	สำนักงานการศึกษา

๗. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๒๔๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง และได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมิน ดังนี้

(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๔๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๘.๕๗
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๘๖
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๘.๕๗
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๑๔
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๐๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๐๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๔
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๒๙
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๒๙
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๒.๒๙

❖ เกณฑ์การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๒๙ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๘.๗๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๔๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๗
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๘.๗๑
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๖
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๔๓
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๒๙
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๒๙
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๓.๘๖
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๘๖
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๔๓
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๐๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๑๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๗
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๑๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๔๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๕.๒๙

❖ เกณฑ์การประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ซึ่งจากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๕.๒๙ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ❖

๘. ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินโครงการ
๒. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๓. ควรกำชับให้สำนักการช่างบริหารจัดการห้วงเวลาในการจัดทำแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างทุกประเภท เนื่องจากส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๔. ควรจัดหาบุคลากรทดแทน กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการในห้วงเวลาที่กำหนดได้
